


Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)

Speciale transporten

Week van 7-13 maart

Zondagnacht	RH-3.5
Maandagnacht	OM-1.1 en RH-1.2
Dinsdagnacht	RH-1.2
Woensdagnacht	RH-3.5 en RH-1.3
Donderdagnacht	RH-3.3
Vrijdagnacht	RH-3.3, RH-3.2 en DEE-2.5

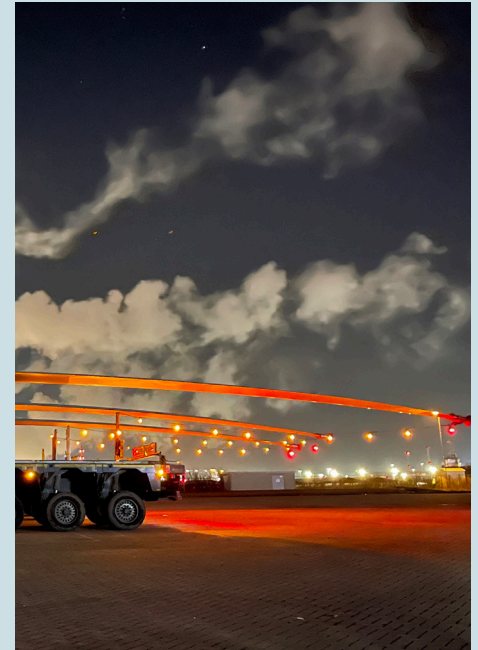

De speciale transporten van rotorbladen vertrekken uit het havengebied Moerdijk..

8-12 maart

OM-1.2 en RH-1.3 Staalplaten als tijdelijke verharding aanbrengen o.a. bij bochten voor de hijskranen

8-13 maart

RH-1.3	Hijswerkzaamheden bouw windturbine. Aansluitend verhuizen hijskraan naar RH-1.2
OM-2.1	Hijswerkzaamheden bouw windturbine. Aansluitend verhuizen hijskraan naar OM-1.2
Lijnen DEE-1 en OM-2	Inspecties
DEE-1.4, DEE-1.5, DEE-1.3 en OM-2.9	Inschakelen (Voorbereidingen in bedrijf stelling)
Lijnen DEE-1, OM-2, RH-1	Installatiewerk in de turbines
