


Werkzaamheden komende week
(als de weersomstandigheden het toe laten)

Speciale transporten, week van 12-16 april

Maandagnacht	Geen transporten
Dinsdagnacht	RH-3 lijn
Woensdagnacht	RH-3 lijn
Donderdagnacht	RH-3 lijn
Vrijdagnacht	Geen transporten

Naar verwachting zullen nog zo'n 4-5 weken transporten plaatsvinden, totdat alle onderdelen aangekomen zijn.

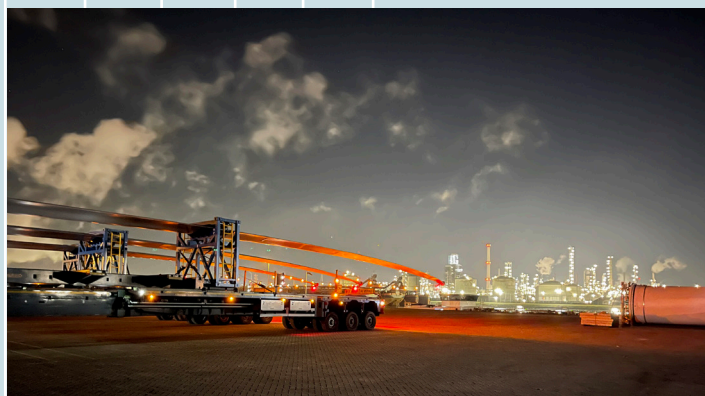

12-16 april

RH-1.1	Opbouw bovendeeel windturbine; na afronding verhuist de hijskraan naar DEE-2.7
OM-1.3	Opbouw bovendeeel windturbine; na afronding verhuist de hijskraan naar OM-1.4
Lijn DEE-1 en OM-2.9 tot OM-2.6	Versmallen cementgebonden verharding
DEE-1.6 tot DEE-1.9 en OM-2.6 tot OM-2.3 OM-2.6 en OM-2.7	Installatiewerk Inschakelen
DEE-1.4 en DEE-1.3 OM-2.8 en OM-2.9	Commissioning
Gehele windpark	Herstel drainages
DEE-1-4 tot DEE-1.9	Aanleg drainage langs toegangswegen en rond turbinefundering
Lijn OM-1, Lijn RH-3, Lijn DEE-2 en DEE-3.1	Slepen; voorkomen nestelen vogels in broedseizoen.

Hinder door hijsen

Komende week verhuist de grote hijskraan van de lijn RH-1 naar DEE-2.7. Om een veilige overstek van de Drentse Mondenweg te garanderen zijn verkeerslichten geplaatst.



Langs de lijn DEE-1 vordert de aanleg van drainages.
